2026 Q3 · BUSINESS REVIEW

三季度项目汇报

项目全景 · 定点与量产 · 订单交付 · 风险与四季度计划

汇报人：曹旭锋（Zane）

常州臻畅汽车配件有限公司 · 上海泰瑞电子科技有限公司

2026 年 10 月 18 日 | 数据口径：三季度（7/1–9/30）未税

一页看懂三季度

13 个项目在管：量产 6 · 已定点 2 · OTS 1 · 推进中 4

13 个

在管项目

量产 6· 定点 2·OTS1· 推进 4

4 个

Q3 新增定点

ZH5EM·SHD·ROX MY26·S56

2 个

Q3 新增 SOP

VFe32 7/31·BC03 8/3

91 件

在册零件（明细）

自制 + 外协，供应商可追溯

916,915 件

Q3 订单数量

98 行 PO / 7 个件号

40.18 万元

Q3 订单含税金额

含 S56 首单 2.32 万（10/18 定价）

最大成果： Q3 拿下 4 个定点

ZH5EM （上汽前舱储物盒 10 件）、 SHD （上汽毛毡 1 件）、 ROX MY26 （极石端盖 2 件）、 S56 （奇瑞 X3/X3L 吸音棉 14 件）。其中 S56 年均 5 万套、 EOP 2029.12 ，是明年主要增量。

收入结构：仍高度集中

LEV1 17.97 万（44.7%） + VFe32 9.88 万（24.6%） = 69.3%； EHEA 7.77 万（19.3%）已开始批量， S56 定价后进账 2.32 万（5.8%）。三者合计 93.6%。

最大隐患： EHEA 质量 + 供应商未定

EHEA 9/23 出货排定备注「目前有大质量问题」，涉 562,077 件； ZH5EM 10 件供应商待采购确认。 ROX01 与 S56 价格均已落地（10/18）。

Q3 四个新定点

全部在三季度内落地： 8/27 两个、 9/1 一个、 9/16 一个

ZH5EM

定点日 2026-08-27

凯华 → 上汽

前舱储物盒 · 10 件（8 泡棉 + 2 蘑菇塔扣）

8/27 客户定点；外协询价与送样启动（泡棉 - 宁波互盛、塔扣 - 惠州兰谷）；项目经理陈阳已建 CAMDS 零件信息；供应商待采购确认

SHD

定点日 2026-08-27

凯华 → 上汽

密封板毛毡 · 1 件（12478375-1）

8/27 客户定点； OTS 250 套样品已完成送样；正在排测试计划，待内部安排测试

ROX MY26

定点日 2026-09-01

浙江凯华 → 极石

左右端盖板吸音棉 · 2 件（15200958AA / 15200961AA）

9/1 内部定点：左 0.3097 / 右 0.3009 未税，利润率 12.83% / 23.56%；自制 · 上海泰瑞， 11 月开始 SOP 交付

S56

定点日 2026-09-16

浙江凯华 → 奇瑞 X3/X3L

PP/PET 吸音棉 · 14 件（51-12723 已取消，实际 13 件）

9/16 内部定点：年均 5 万套、 EOP 2029.12 ； 报价按统一毛利率 22.31% （年净利约 20 万）； 9/18 已出 5 个件号共 25 件样品

量产项目： 6 个（Q3 订单主体）

内部状态「交付量产」 = 是： BC03 、 LEV1 ； 否： VFe32 、 S56 、 EHEA 、 ROX01

项目	客户	车型	零件	交付量产	Q3 订单 (含税)	占比	Q3 关键动作
BC03	凯华	VINFAST	1	是	**14,164.80**	3.7%	8/3 SOP ； 合同确认、对账开票中
LEV1	凯华	VF-LIMO7 RHD	5	是	**179,659.14**	47.5%	量产对账；四件诚丰外协 + 挡脚板泰瑞自制
VFe32	凯华	VINFAST	19	否	**98,826.72**	26.1%	7/31 切换件 SOP ； 9/4 叫停 9/20 已解除
S56	浙江凯华	奇瑞 X3/X3L	14	否	**23,239.66**	5.8%	9/16 定点； 10/18 出价（套含税 19.29/ 毛利 18.4% ）； 首单已定价
EHEA	凯华	海豹 06GT	21	否	**77,697.31**	20.5%	样品认证合格； 562,077 件分 9/28 、 10/5 两批交付
ROX01	凯华	极石 01	4	否	**7,830.00**	2.1%	已定点定价；批量交付中；套含税 4.10 、毛利 11.0%

注：订单金额取看板 PO 台账按 PO 日期 7/1–9/30 汇总（98 行 / 916,915 件 / 含税 ¥378,522.97 ）。 S56 首单 PO4500127228 共 7 行、 12,040 件已按 10/18 价格表回填含税 ¥23,239.66 。

推进中： 4 个项目（四季度增量来源）

OTS 1 个单列： ROX MY26 已定点、 11 月 SOP

T12T

核价

凯华 → 奇瑞 QQ5

10 件（吸音棉 7 + 毛毡 3）

当前进展

成本表已出并报价凯华，等待最后一轮核价

下一步： **SOP 2027.3**

CX835

暂缓

凯华 → 长安福特烈马

4 件吸音棉

当前进展

8/26 客户询价、内部启动；车型暂无量，暂缓推进

下一步：**等技术要求**

VFe32-3M 胶带

送样

凯华 → VINFAST

3M 海绵胶 16 件

当前进展

7/28 图纸已收到；准备供小样 20 片

下一步：**小样**

BS5PR

报价

海泰 → 智己

泡棉定位销 1 件

当前进展

10/10 发起定点询价； 10/13 内部完成成本核算

下一步：**获取对方目标价**

判断：四个项目都还停在「报价 / 核价 / 送样」段， Q3 未产生收入。 T12T 与 BS5PR 最接近落地（均已报价或完成成本核算）， CX835 因车型无量建议降优先级。 VFe32-3M 胶带是现有客户内的品类扩展，样品阶段成本低、值得推。

Q3 大事记（7–9 月，节选 10 条）

完整 36 条见《臻畅 -2026Q3- 项目汇总 -20261018.xlsx》「03_Q3 大事记」

07-15	VFe32 客户定点
07-31	VFe32 SOP 量产（切换件）
08-03	BC03 SOP 量产，首批 248 件
08-20	ROX01 客户询价，内部启动
08-27	ZH5EM 、 SHD 同日定点
09-01	ROX MY26 内部定点（左 0.3097 / 右 0.3009 未税）
09-12	EHEA 样品认证合格，启动拉动
09-16	S56 内部定点： 14 件 / 年均 5 万套 / EOP 2029.12
09-18	S56 5 个件号 25 件样品； 51-12723 取消
09-23	**EHEA 562,077 件分批出货排定（⚠ 大质量问题）**

Q3 三个节点


新定点
4 个

新 SOP
2 个

节点总数
36 条

Q3 订单结构

98 行 PO / 916,915 件 / 含税 ¥401,762.63（按 PO 日期 7/1–9/30）

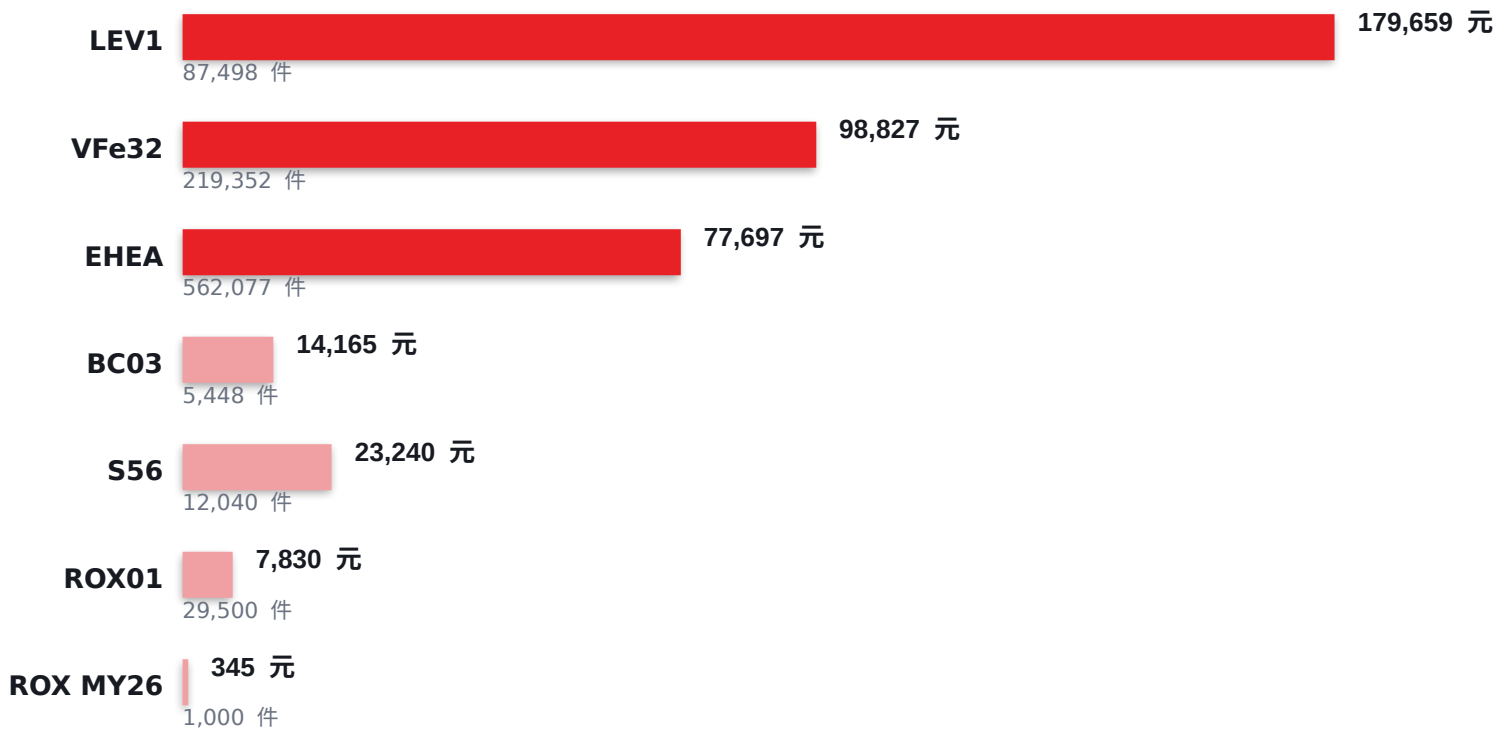

三个事实

① 集中度极高

LEV1 + VFe32 = 27.85 万，占 69.3%。任一项目掉量，季度收入立刻失血。

② EHEA 量最大、额第三

562,077 件占总量 61%，但单价低（合计 7.77 万，单件约 0.14 元），是典型的走量件。

③ S56 已定价进账

10/18 价格表落地，首单 12,040 件计入 2.32 万；Q4 起按年均 5 万套放大。

注：金额与数量取自看板 PO 台账（orders_data.json）按 PO 日期汇总；ROX MY26 为 OTS 阶段首批，量小。

问题与风险（按影响排序）

前三条需要在本周内闭环，否则影响四季度收入确认

P0	**EHEA 「目前有大质量问题」** 9/23 出货计划备注，涉 PO 三单 562,077 件（9/28 发 281,038 件、10/5 发 281,039 件）	件号、根因、影响批量、整改与复检安排均未落纸；一旦批量退货， Q3/Q4 收入与客户信任双损	动作：**今天查清并出书面结论**
P1	**S56 价格已出、待客户签认** 13 件、单车 16 件：套成本 13.9319 / 套含税 19.2886 （毛利率 18.4%）；首单 7 行已回填 ¥23,239.66 。⚠ 表单合计行 15.9771/18.0542 未乘单车用量	未经客户签认即无订单约束力； 18.4% 低于此前 22.31% 报价口径，且 3 件负毛利 / 微利（C 上吸音棉 3 −22.1% 、 C 下吸音棉 1 −1.6% 、 C 上吸音棉 2 +1.8%）	动作：**本周内取得签认，同时提报 3 件低毛利件的工艺降本**
P2	**ROX01 定点价已下、合同与账期未落** 4 件含税 0.70/1.30/0.30/0.08 ，套含税 4.10 、毛利率 11.0% ；年量 12,000 套、年产值 4.35 万	毛利率仅 11% ，且无合同与账期（90 天承兑）文本； Q3 已交 29,500 件、 0.78 万	动作：**补合同与账期确认，按定点价对账**
P1	**ZH5EM 10 件供应商全「待定」** 8/27 定点后外协询价 / 送样启动，采购未确认（暂用宁波互盛、惠州兰谷）	影响 OTS 与量产爬坡；供应商未定则成本与交期都不可控	动作：**催采购确认并锁定样品来源**
P2	**项目数据口径待统一** 项目表零件数合计 108 ，明细表 91 （VFe32-3M 胶带 16 件、 BS5PR 1 件无明细行）； S56 已取消件 51-12723 仍在明细	汇报与看板数字不一致，对外易被抓口径	动作：**下版统一：明细为准或补齐明细**

四季度计划

按优先级： P0 = 不解决就影响收入或交付

P0	**EHEA 质量闭环与交付**	查清问题件号与批次 → 出整改 / 复检方案 → 保 10/5 前 281,039 件交付；对客户书面反馈
P0	**S56 价格签认与排产**	取得客户对 13 件单价的签认 → 首单 PO 生效 → 刀模排版 / 打样确认 → 备料排产；同步启动 3 件低毛利件降本
P1	**ZH5EM 、 SHD 供应商与 OTS**	锁定泡棉 / 塔扣供应商 → 完成 OTS 测试 → 建立 CAMDS 与量产文件
P1	**ROX01 合同与稳定交付**	落合同与 90 天承兑账期 → 与已交付 29,500 件按定点价对账 → 稳定拉动（年 12,000 套）
P2	**T12T 核价、 BS5PR 报价**	T12T 最后一轮核价（SOP 2027.3）； BS5PR 取对方目标价后出报价
P3	**新机会与海外**	VFe32-3M 小样 20 片； CX835 等车型量；上汽越南 AS5PM-X1 （10/18–19 会议，四季度出顶棚工艺与投资方案）

一句话总结：三季度把「定点」做出来了（4 个），四季度要把「钱」做出来 —— 先解决 EHEA 质量与 S56 定价两个 P0，其余按节奏推进。
